


Kloaksanering i Skærbæk 06.04.2021 – 31.04.2022

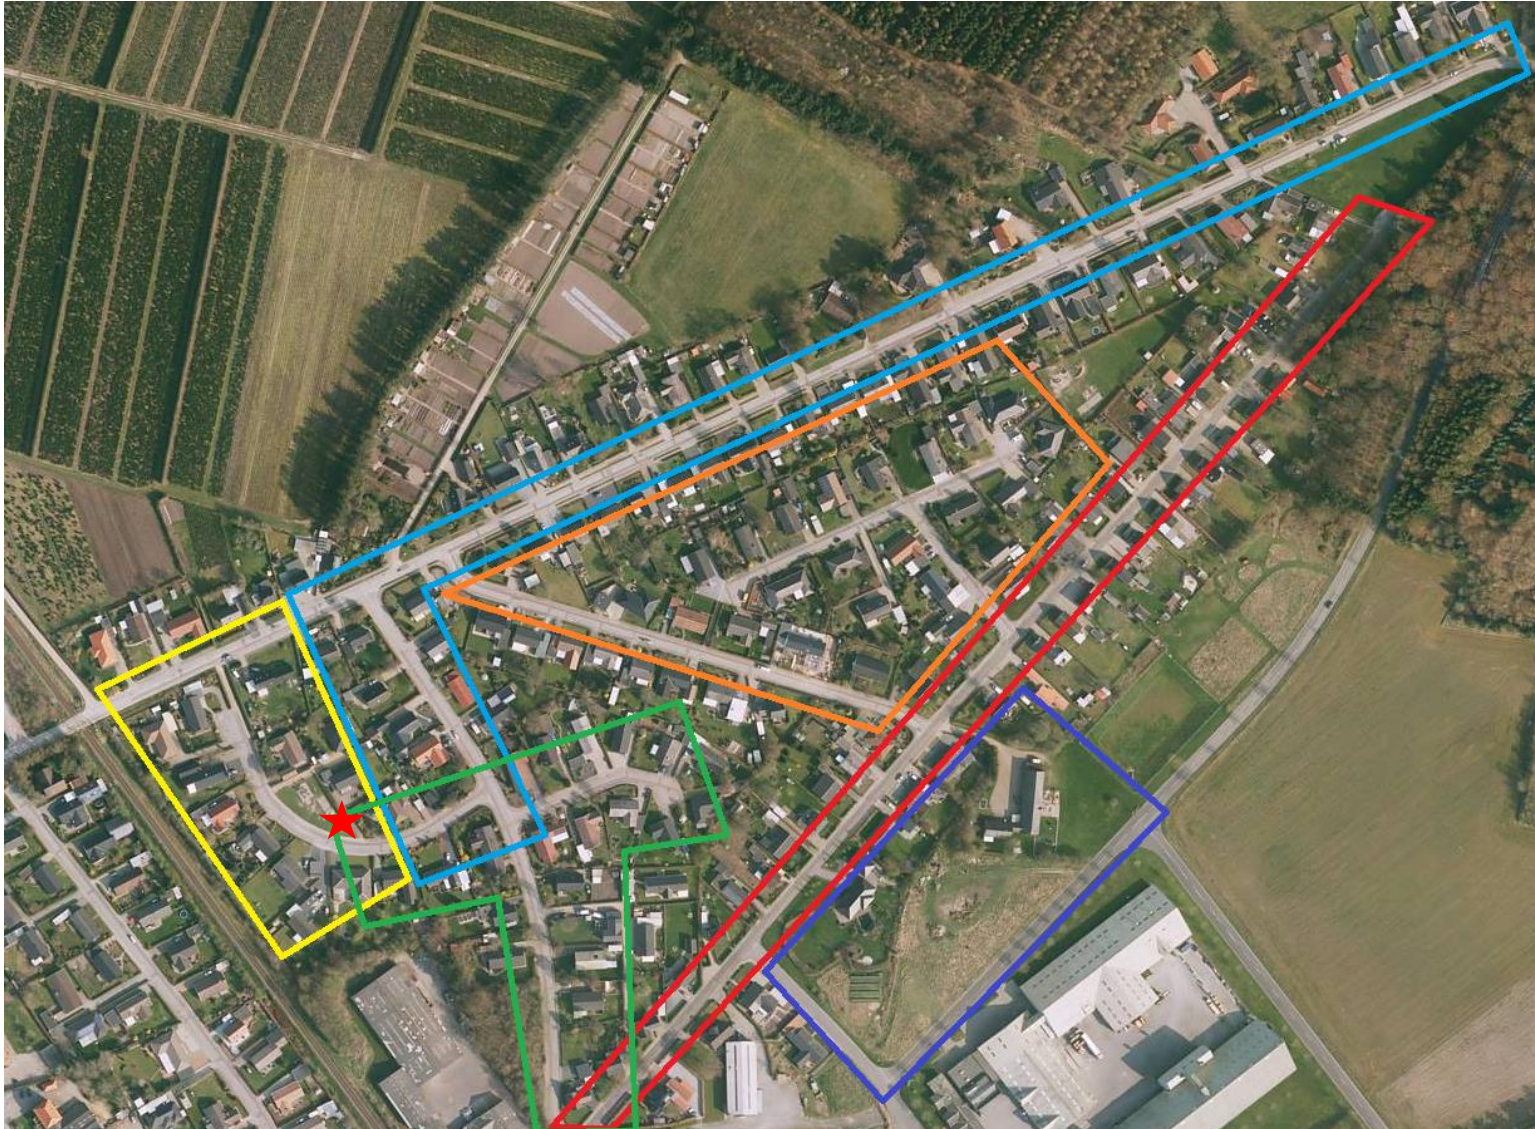

Etape 1. Ugerne 14 – 18

Udgravning og færdiggørelse af basis samt sætning af bygværker.

Etape 2. Ugerne 19 – 24

Sætning af pumpestation og der efter kloakering af Buen og den vestlige del af Ullerupvej.

Etape 3. Ugerne 24 – 43

Kloakering fra pumpstation og det sidste stykke af Buen, der efter den nordlige del af Dalen, og hele Ullerupvej fra vest til nordøst.

Etape 4. Ugerne 40 – 48

Kloakering ud af Grenen og den sidste del af Dalen.

Etape 5. Ugerne 46 – 5 (2022)

Kloakering af Møllevej fra nord til syd, og efterfølgende hele Kilen.

Etape 6. Ugerne 3 – 13 (2022)

Gl. Ullerupvej bliver kloakeret fra sydvest mod nordøst

Pumpestation

