Korttidsplan kloak 2166 Byfornyelse Højer

Entreprenør
Henning Havelt
Vejen 7536 2011
Kolding 7550 4400

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1	**Kloak**			
2	**HOLD 1**			
3	**Kirkegårdsgade**			
4	Brønd 14132R til 14110R 130 meter (fra Søndergade til Nørregade)	24 dage	man 20 dec '21	man 31 jan '22
5	**Nørregade**			
6	Brønd 14110R til 14108R 91 meter (Fra Nørregade 37 til Nørregade 13)	18 dage	tir 01 feb '22	tor 24 feb '22
7	Brønd 14110R til 14147 11,7 meter (Fra Nørregade til Nørrevej)	3 dage	fre 25 feb '22	tir 01 mar '22
8	Brønd 14147R til 14130R 36,5 meter (Bus holdepladsen til Nørrevej)	8 dage	ons 02 mar '22	fre 11 mar '22
9	**Nørrevej**			
10	Brønd 14130R til 14191R 73,7 meter (Fra Nørrevej mod Kirkegårds p-pladsen)	15 dage	man 14 mar '22	fre 01 apr '22
11				
12	**HOLD 2**			
13	**Nørrevej**			
14	Brønd 14137R til 14146R 145,1 meter (Fra "Den tyske skole" til Nørrevej 76)	34 dage	man 06 dec '21	fre 28 jan '22
15	**Nørregade**			
16	Brønd 14110R til 14114R 151,3 meter (fra Nørregade 23 til Nørregade 33)	31 dage	man 31 jan '22	man 14 mar '22
17	Brønd 14108R til 14104R 110,7 meter (Fra Nørregade 13 til Nørregade 3)	22 dage	tir 15 mar '22	ons 13 apr '22
18	Brønd 14104R til 14103R 34,7 meter (Fra Nørregade 3 til Nørregade 1)	6 dage	tor 14 apr '22	tor 21 apr '22
19				
20				
21	**HOLD 3**			
22	**Nygade**			
23	Brønd 14184R til 14185R 106,0 meter (Fra Nørrevej)	21 dage	man 17 jan '22	man 14 feb '22
24	**Nørrevej**			
25	Brønd 14137R til 14236R 56,8 meter (Fra Nørrevej op til "Den tyske skole")	11 dage	tir 15 feb '22	tir 01 mar '22
26	Brønd 14146R til 14250R 341,8 meter (Fra Nørrevej 76 til Nørrevej 98)	56 dage	ons 02 mar '22	ons 18 maj '22

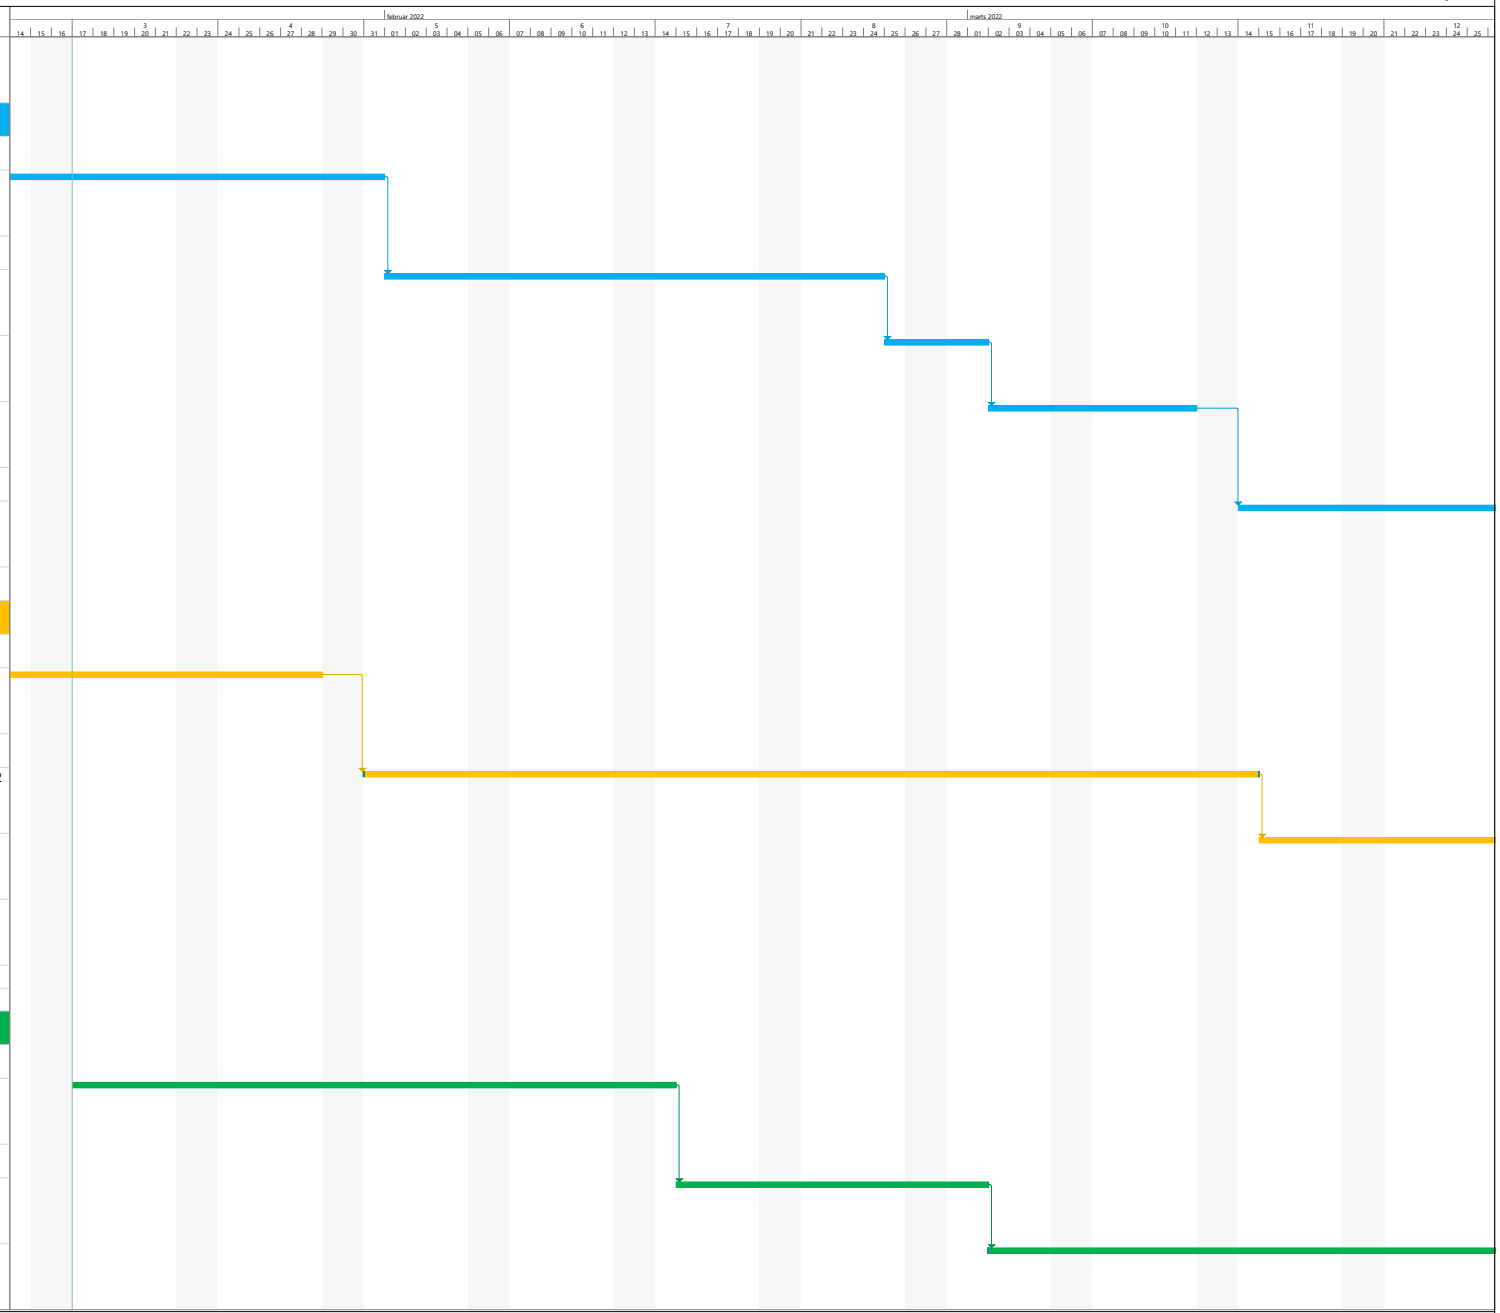

Projekt: Korttidsplan Kloak 17.0
Dato: man 17 jan '22

Opgave · Opdeling · Milepæl · Hovedopgave · Projektoversigt · Inaktiv opgave · Inaktiv milepæl · Inaktiv oversigt · Manuel opgave · Kun varighed · Manuel oversigtsopløftning · Manuel oversigt · kun start · Kun sluddato · Eksterne opgaver · Ekstern milepæl · Deadline · Fremdrift · Manuel status
